Diagrama de Gantt semanal - PPS Cobot dispensador de mantas

Project Start: Semana 1 / Día 0

Project Name: PPS Cobot dispensador de mantas

Etapas: Ingeniería / pruebas · Compra · Fabricación · Integración / puesta en marcha

Cronograma

#	Actividad	Responsable	Etapa	Inicio(sem)	Fin(sem)	Duración[sem]	Estado	%
1	Planeamiento y recolección de datos		Ingeniería	1	2	2	Complete	100%
2	Pruebas sobre el gripper		Validación técnica	3	4	2	Complete	100%
3	Diseño del sistema		Ingeniería	5	7	3	Complete	100%
4	Requisición y compra del robot/componentes		Compras	8	20	13	In progress	80%
5	Mecanizado dispositivo separador de mantas		Fabricación	19	20	2	Complete	100%
6	Armado del sistema		Integración	21	21	1	Complete	100%
7	Testeo final		Validación final	22	22	1	Complete	100%
8	Implementación		Puesta en marcha	23	23	1	Complete	100%

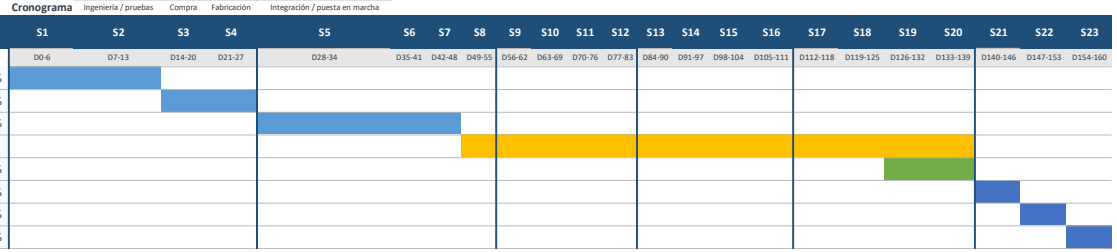

Nota: el mecanizado se planifica en las últimas 2 semanas de la etapa de requisición y compra para acortar el plazo total del proyecto.
